

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Domínios de Desempenho de Projetos

Prof Roberto Paldês

ceub.br

Princípios de gerenciamento de projetos			
Seja um intendente diligente, mantenha uma conduta de respeito e cuidado	Crie um ambiente de equipe colaborativa	Engaje-se de fato com as partes interessadas	Mantenha o foco no valor
Reconheça, avalie e reaja às interações com o sistema	Demonstre comportamentos de liderança	Faça o <i>tailoring</i> com base no contexto	Promova qualidade em processos e resultados
Navegue pela complexidade	Otimize respostas a riscos	Adote adaptabilidade e resiliência	Aceite a mudança para alcançar o estado futuro previsto

Guie o comportamento



Tailoring para adequação no contexto do projeto

Figura 3-8. *Tailoring* para adequação no contexto do projeto

Fonte: PMBOK, 7ª edição



Um Sistema Integrado e Simultâneo

Juntos, os domínios de desempenho formam uma **totalidade unificada**. Eles operam como um sistema integrado, sendo interdependentes para permitir a entrega bem-sucedida do projeto.


- **Não são sequenciais:** São executados simultaneamente do início ao encerramento do projeto.
- **Não são isolados:** As áreas de foco se sobrepõem e se interconectam constantemente.
- **São adaptáveis:** A forma como se relacionam muda conforme o contexto da organização, entregas e equipe.



Domínios de Desempenho de Projetos: PMBOK 7ª Edição

- 1 Partes Interessadas**
(O “Quem” Externo)
- 2 Equipe do Projeto**
(O “Quem” Interno)
- 3 Abordagem e Ciclo de Vida**
(O “Como”)
- 4 Planejamento**
(O “O Quê” e “Quando”)

2.1 Domínio das Partes Interessadas: O Ciclo de Engajamento

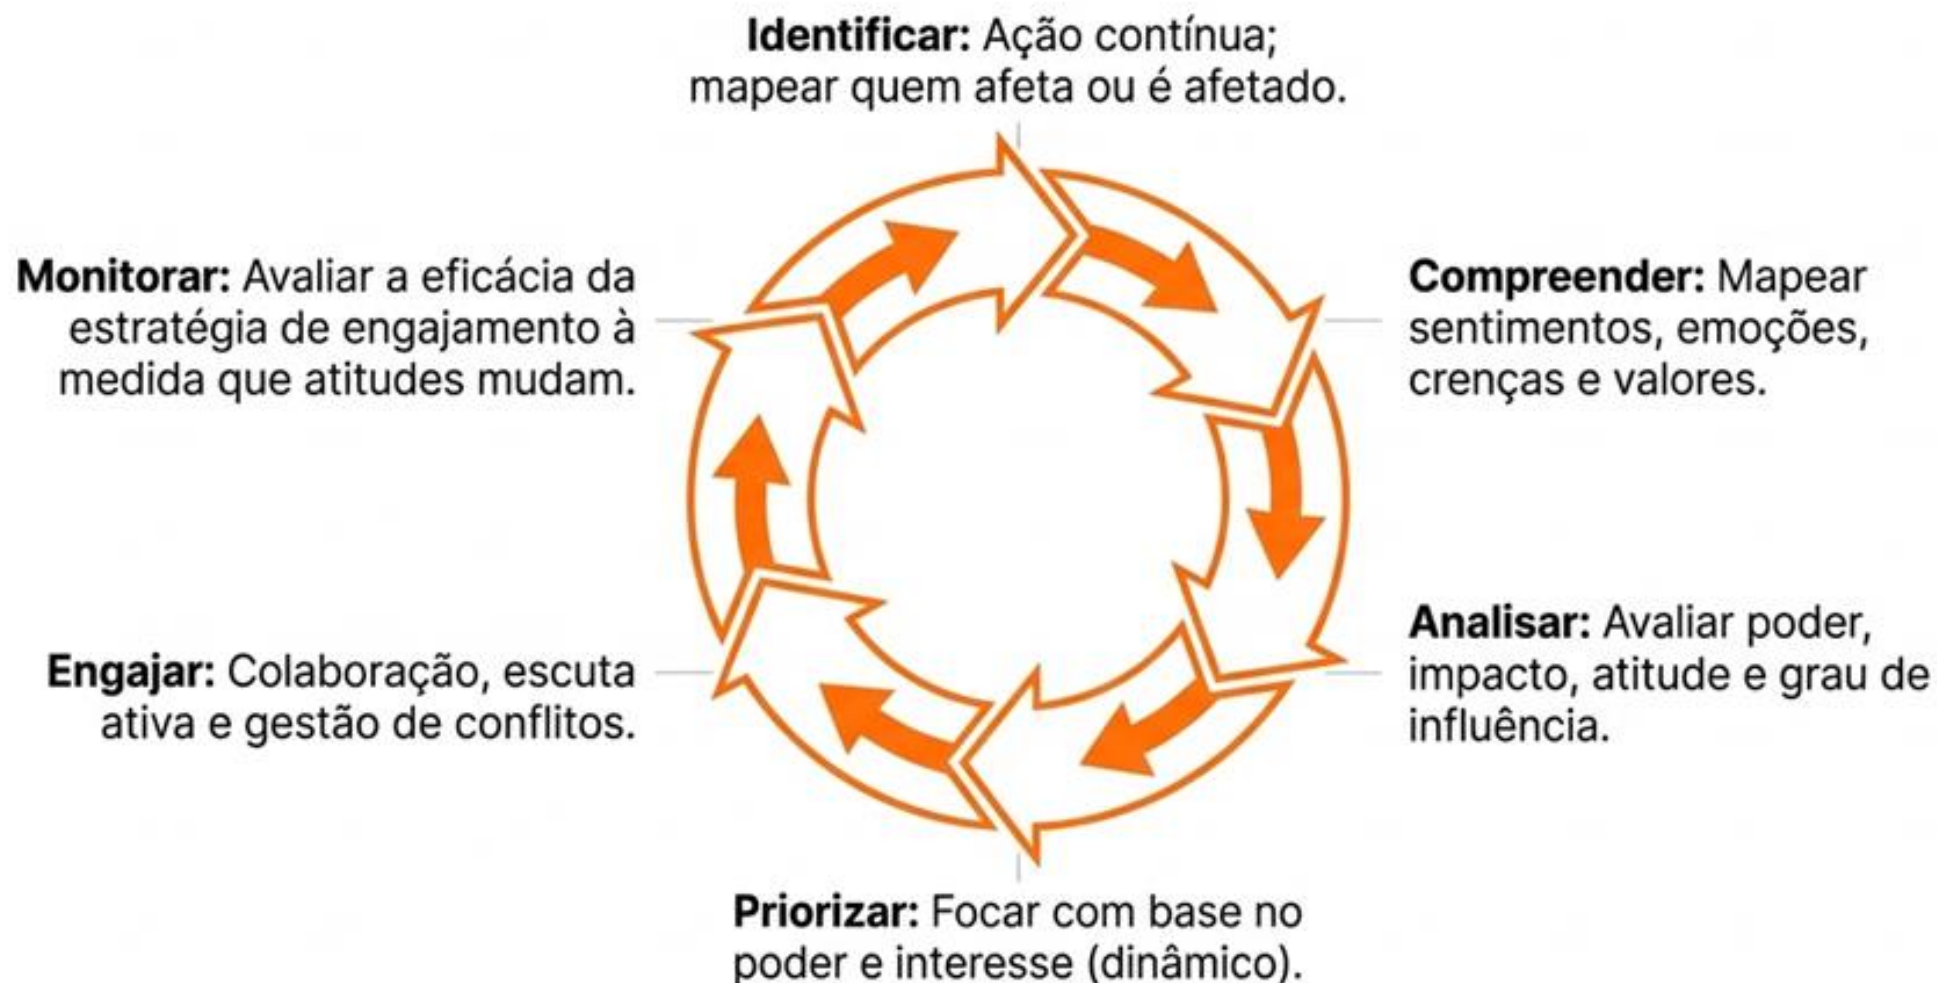

Comunicação Direcionada e Verificação de Resultados

Matriz de Comunicação

Verbal (Apresentações, reuniões)	Formal (Business case, briefings)
Escrita (Relatórios, e-mails)	Informal (Conversas ad-hoc, mídias sociais)

A comunicação deve ser Ativa (deliberada), Passiva (repositórios acessíveis) e Interativa (feedback rápido).

Verificação de Resultados <i>Como sabemos que o engajamento funcionou?</i>	
1	Resultado esperado: Relação de trabalho produtiva e alinhamento de objetivos.
2	Métrica observável: Menor número de alterações ou modificações tardias no projeto; feedback positivo em pesquisas e entrevistas.

2.2 Domínio da Equipe: Inteligência Emocional e Liderança

Liderança

Centralizada: Focada no gerente.

Distribuída: Auto-organizada.

Liderança Servidora: Foco em remover obstáculos, proteger a equipe (escudo de desvios) e prover incentivo.

Autoconsciência

Como você afeta a equipe?
Realizar autoavaliação realista.

Autogerenciamento

Pensar antes de agir;
suspender julgamentos precipitados.

Consciência Social

Ser empático; empregar escuta ativa.

Habilidade Social

Estabelecer relacionamentos;
gerenciar atitudes construtivamente.

Cultura de Alto Desempenho e Gestão de Conflitos



Propriedade Compartilhada:
Sentimento de dono sobre os resultados.



Adaptabilidade e Resiliência:
Adaptação de métodos e rápida recuperação de falhas.




Comunicação Aberta e Confiança: Ambiente seguro sem silos.

Abordagem a Conflitos (Regras de Ouro PMBOK 7)

Do / Foque nos fatos ,	Don't , não nas pessoas (evite personalizações).
Do / Foque no presente e futuro ,	Don't , não no passado (não busque culpados, busque soluções).
Do / Procure alternativas juntos ,	Don't , (construção mútua vs. imposição).

2.3 Abordagem de Desenvolvimento: O Espectro Metodológico

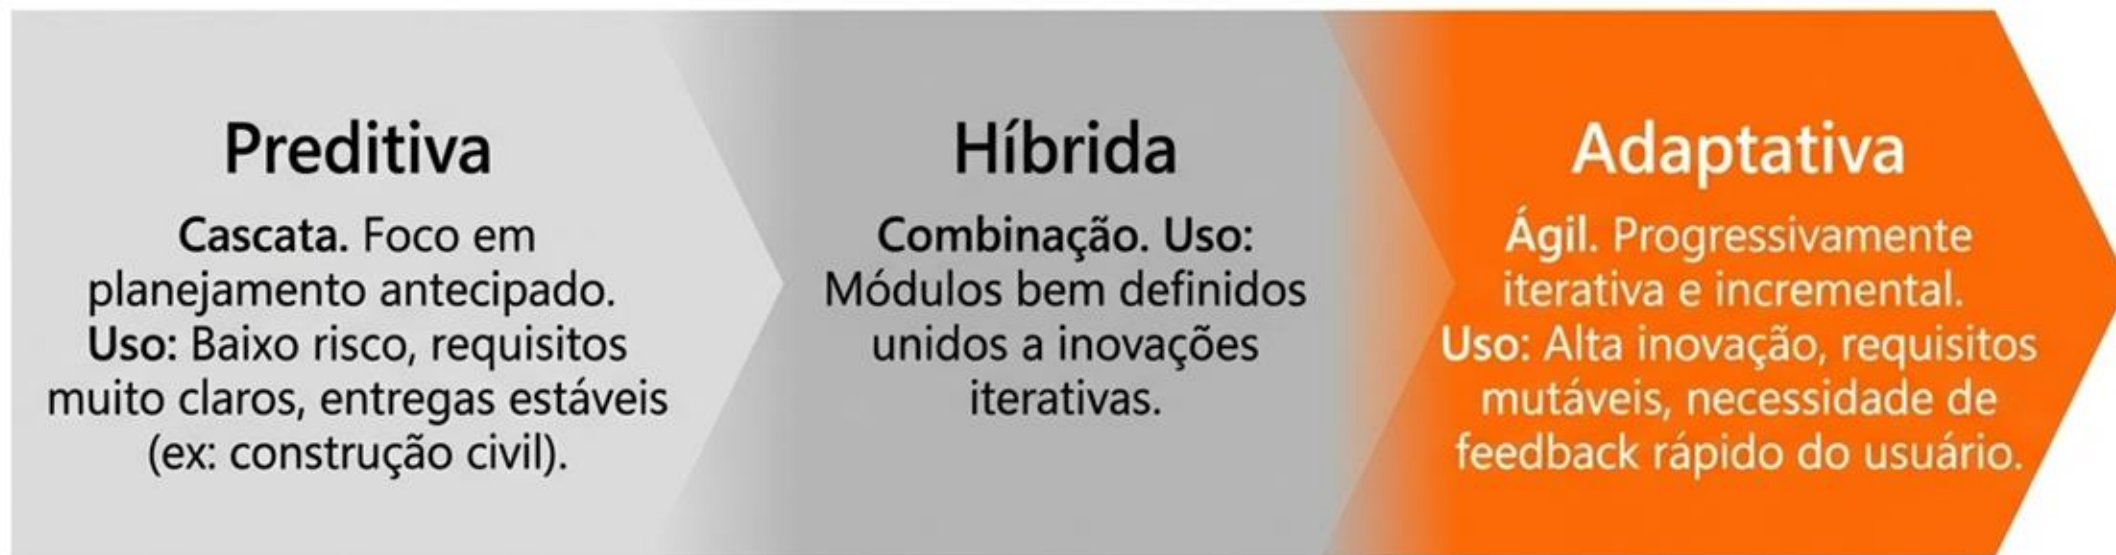


Critérios de Escolha

Grau de inovação, Certeza dos requisitos, Facilidade de mudança, Risco e Regulamentações.

Ciclo de Vida e Cadência de Entrega

A cadência refere-se ao tempo e à frequência das entregas (separado de como o produto é construído).

Entrega Única



(Ex: Implantação de um sistema ERP em data única).

Entregas Múltiplas



(Ex: Lançamento de diferentes funcionalidades de um site ao longo dos meses).

Entregas Periódicas



(Ex: Atualizações mensais de segurança em um software).

2.4 Domínio do Planejamento: Adaptação da Coordenação

O planejamento é um esforço holístico e contínuo, não uma fase isolada, e deve se moldar à abordagem de desenvolvimento.

Escopo, cronograma e custos são determinados antecipadamente.

Criação de linha de base rígida.

O progresso segue o plano inicial.


Visão do Produto

Plano de Liberação (múltiplas iterações)

Plano de Iteração
(funcionalidades/histórias de usuário)

Estimativas baseadas em pontos de história em vez de cronogramas fixos de longo prazo.

Síntese: A Arquitetura do Valor do Projeto

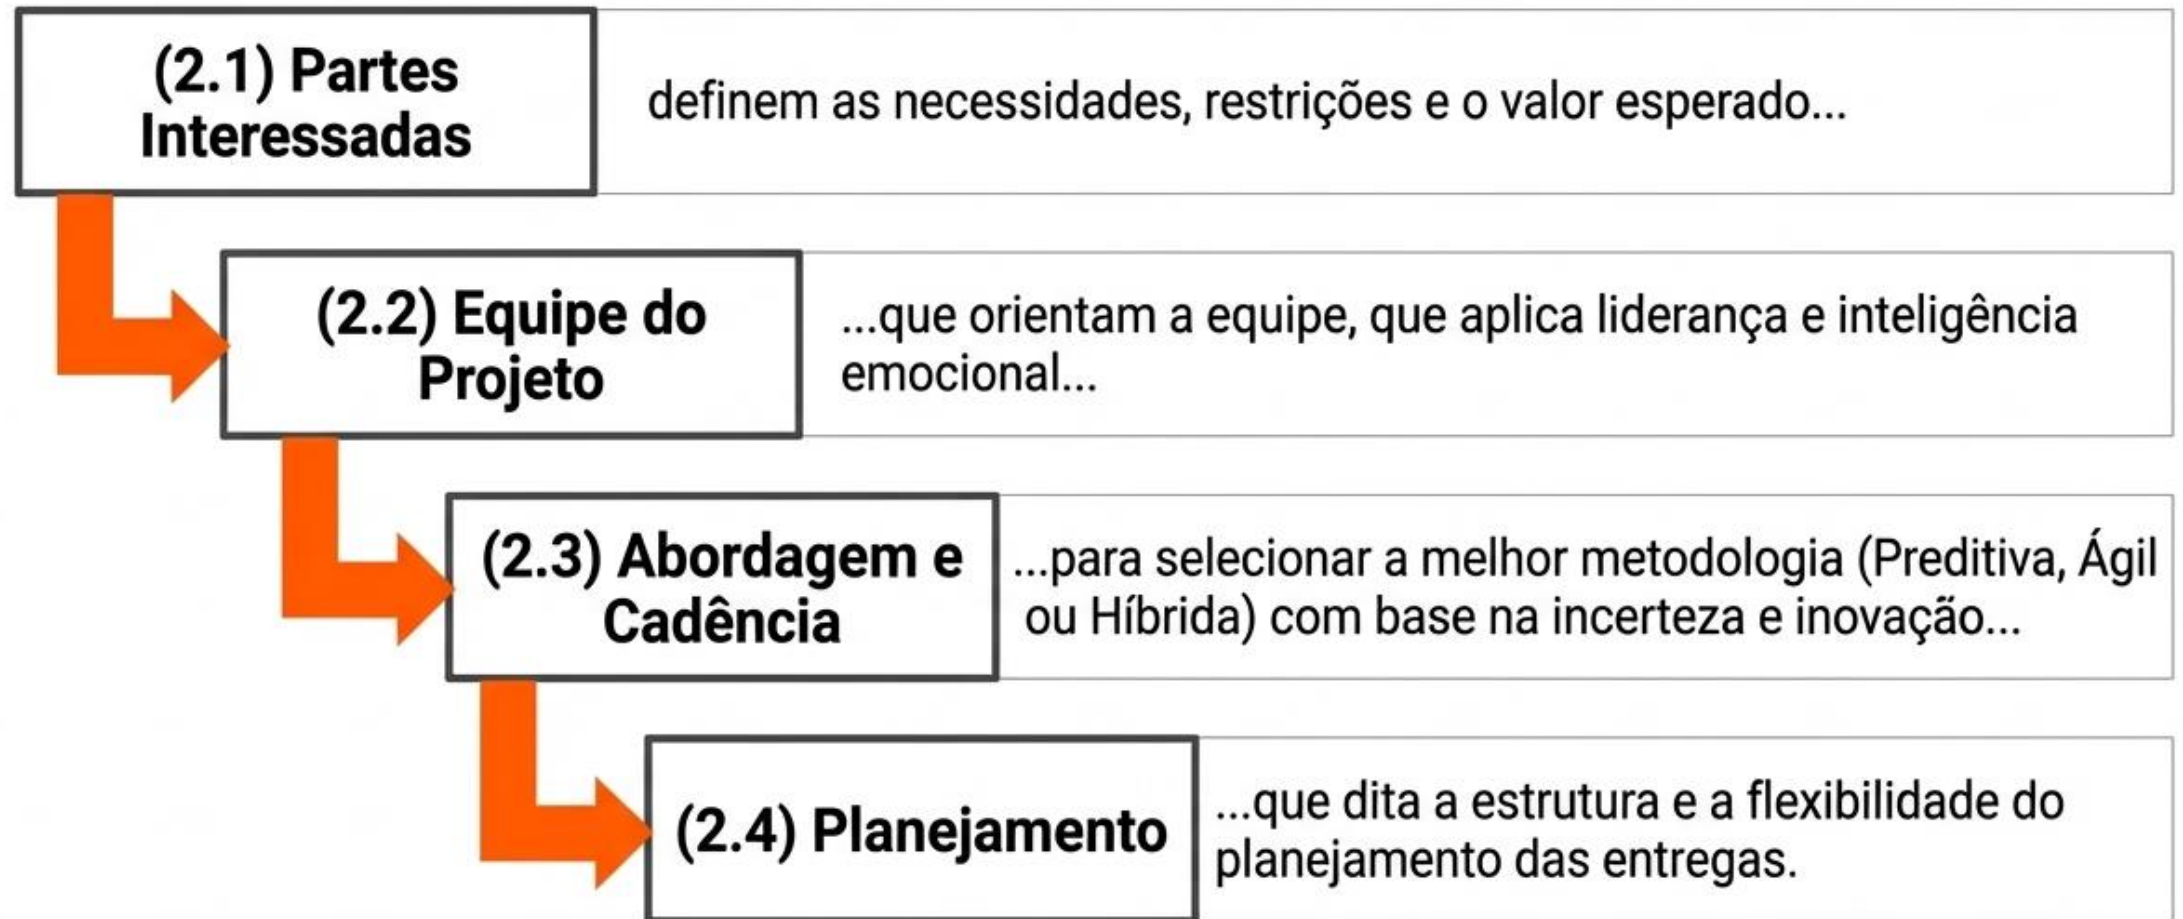

O domínio metodológico do PMBOK 7 não está na execução isolada destas áreas, mas na capacidade de calibrar continuamente as interações entre as pessoas (2.1, 2.2) e os processos (2.3, 2.4) para otimizar os resultados do negócio.




2.5 O Trabalho: Otimização de Processos e Conhecimento

Métodos de Produção Lean


Foco: Identificar e remover desperdícios (atividades sem valor agregado).

Prática: Mapeamento da cadeia de valor.

Ferramenta: Retrospectivas ou lições aprendidas periódicas.

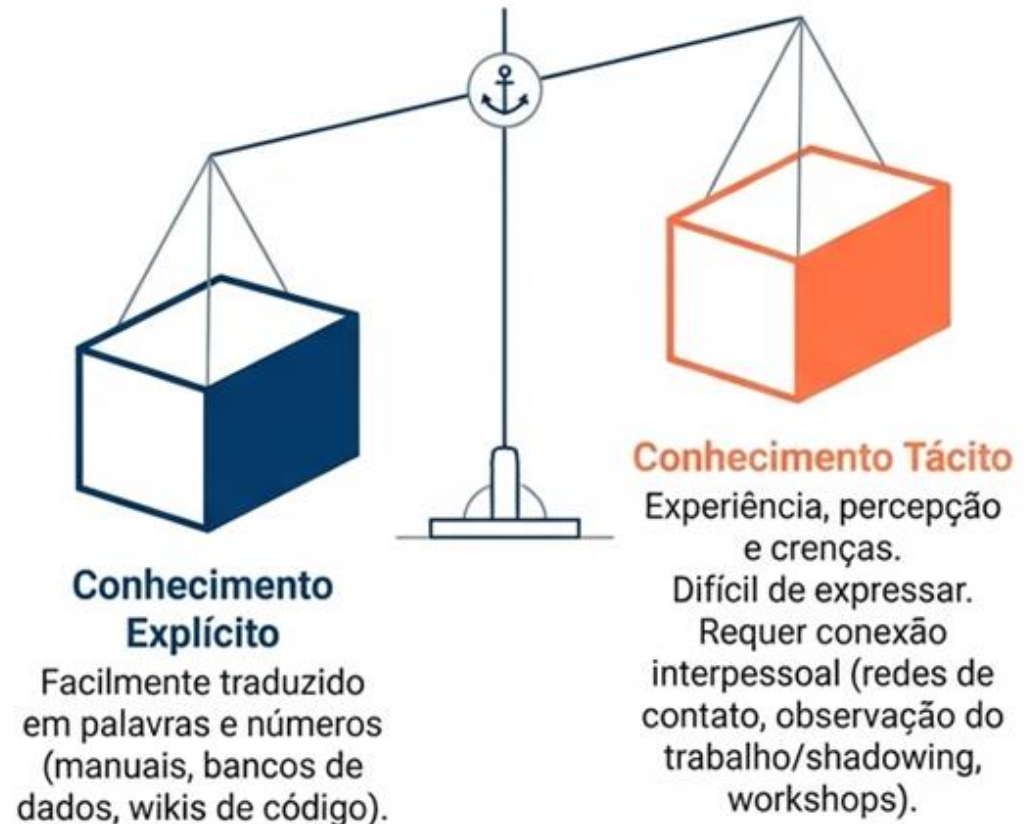

2.5 O Trabalho: Aquisições, Recursos e Auditoria

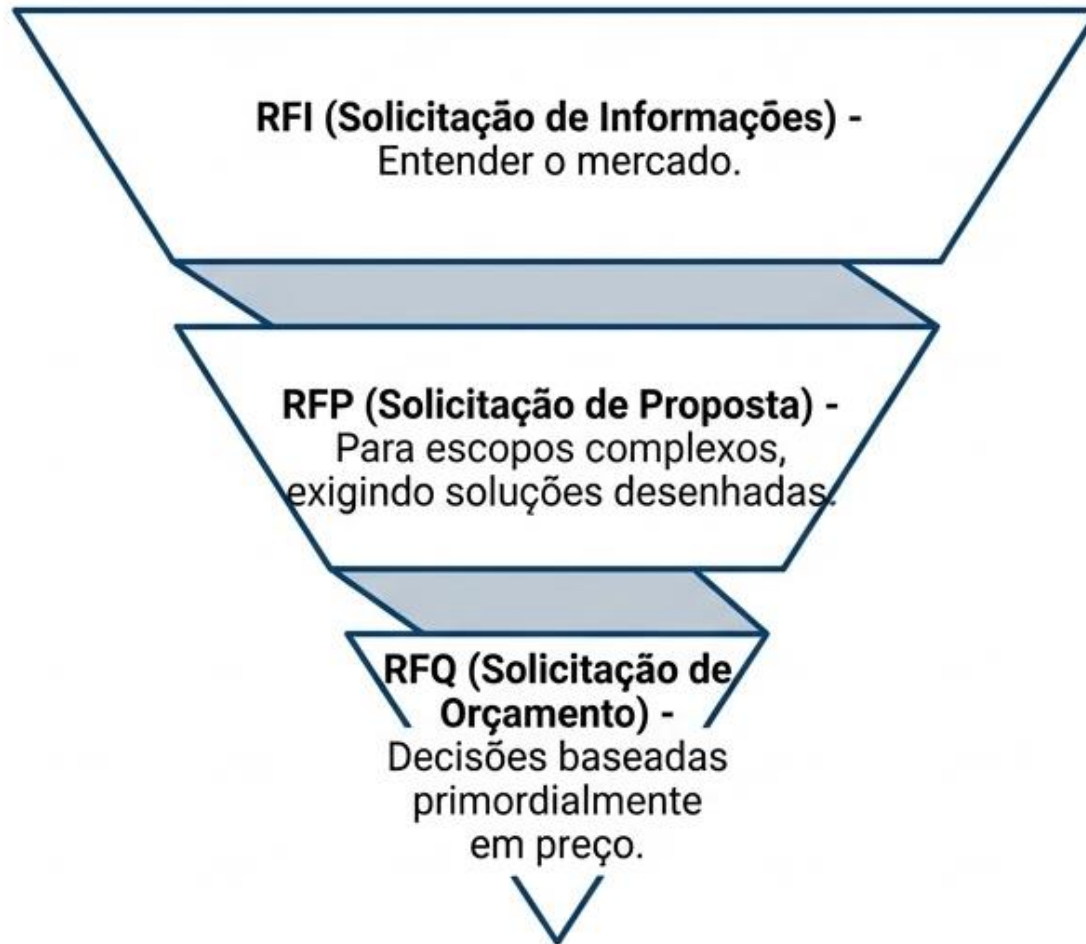


Estratégia de TI: Contratos Adaptativos

Em projetos de software, usa-se anexo/aditivo adaptativo para permitir alteração de escopo sem violar o contrato mestre (ex: Squads as a Service).

Painel de Métricas (Verificação)

Desperdício:	Rastreamento de tempo sem valor agregado (ex: planilhas de timesheet focadas em categorias ociosas).
Eficácia:	Relatórios de status confirmando a melhoria contínua (lead times).

2.6 A Entrega: Decomposição do Escopo e Requisitos

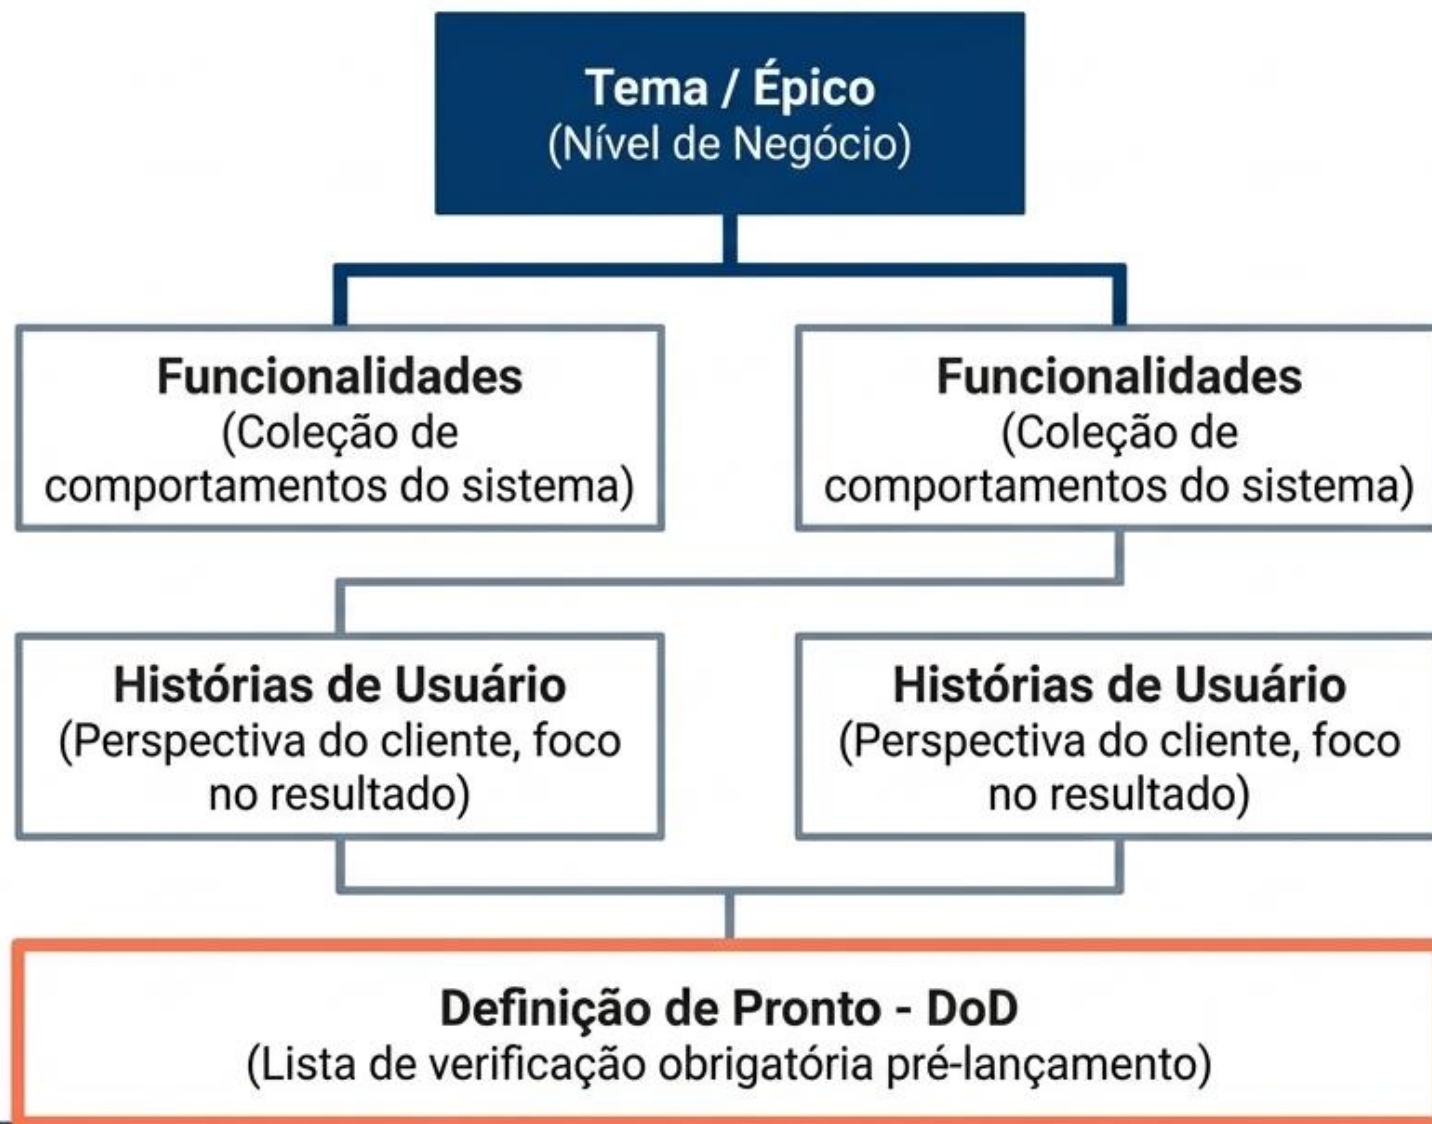

Requisitos de Alta Qualidade


- ✓ **Clareza:** Interpretação única.
- ✓ **Concisão:** Mínimo de palavras.
- ✓ **Verificável:** Pode ser testado.
- ✓ **Rastreável:** Identificador exclusivo para conexão ao valor.

Exemplo TI

Lançamento de MVP. Metas móveis de conclusão em mercados de resposta rápida.

2.6 A Entrega: O Custo da Qualidade e Mudança

Curva de Custo da Mudança de Boehm

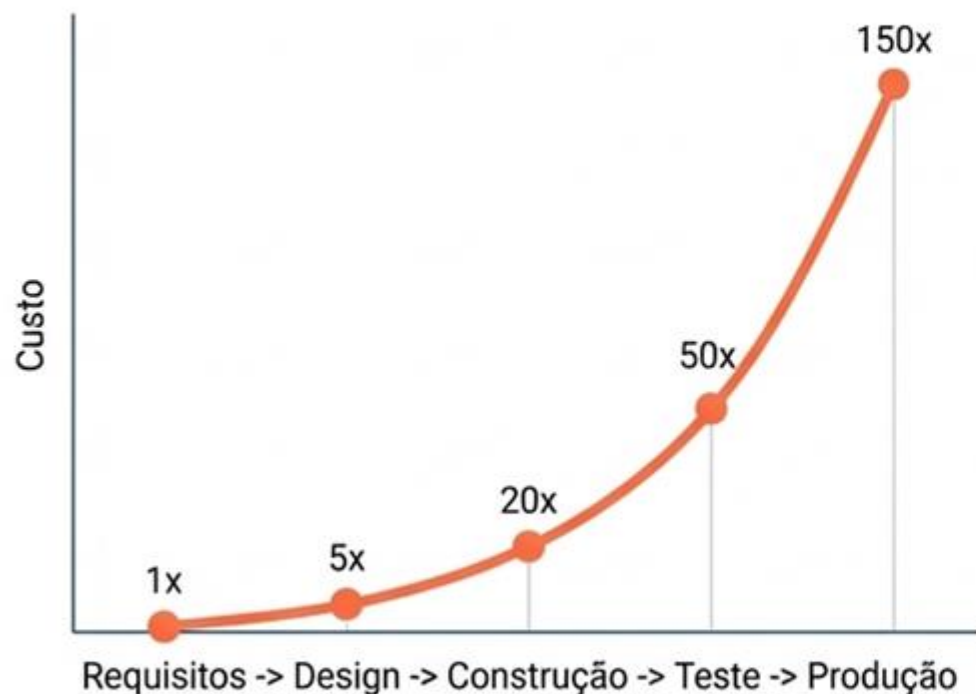

Descobrir defeitos tardiamente aniquila o orçamento do projeto.

Metodologia do Custo da Qualidade (CDQ)

Prevenção: Treinamento, design, planejamento.	Avaliação: Testes, inspeções de código, auditorias.
Custos para impedir defeitos, como requisitos claros, revisão de design, treinamento de equipe e planejamento da qualidade.	Custos para determinar conformidade, como testes de unidade, integração e sistema, revisões por pares e auditorias de processo.
Falha Interna: Retrabalho, sucata, correção de bugs pré-release.	Falha Externa: Reclamações de usuários, perda de reputação, correção em Produção.
Custos de defeitos encontrados antes da entrega ao cliente, como depuração, re-teste, correção de código e desperdício de esforço.	Custos de defeitos encontrados após a entrega, como suporte ao cliente, patches de emergência, recalls, garantias e dano à imagem da marca.

2.7 A Medição: Categorias e Indicadores de Desempenho

Indicadores de Antecipação (Leading)



Preditivos. Focam em mudanças ou tendências desfavoráveis antes que extrapolem limites.



Ex TI: Tamanho do backlog em andamento.

Difíceis de quantificar, fáceis de agir.

Indicadores de Espera (Lagging)



Históricos. Medem entregas ou eventos finalizados.



Ex TI: Quantidade de defeitos por release, variação de custo.

Fáceis de medir, mostram consequências.

Específico:



Mede apenas o alvo.

Significativo:



Vinculado ao Business Case.

Alcançável:



Realista com a tecnologia atual.

Relevante:



Fornece valor de tomada de decisão.


Oportuno:



Chega a tempo de permitir mudança de rota.

2.7 A Medição: O Painel de Controle Operacional

Métricas Baseadas em Linha de Base (EVM)

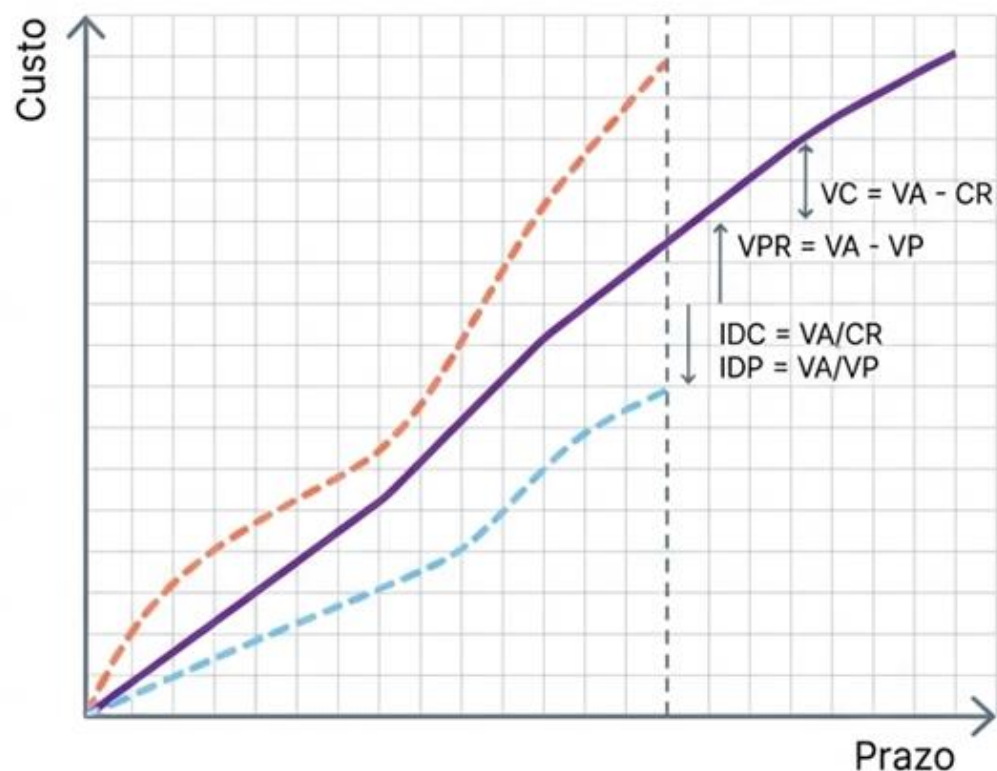

Valor planejado (VP)

Custos reais (CR)

Valor agregado (VA)

VPR (Variação de Prazos),
IDC/IDP (Índices de
Desempenho).
Previsão de custo (ENT/EPT).

Tempo de Ciclo & Fila

Lead Time: Duração da entrada no backlog até o lançamento (deployment).

Lei de Little: O tempo de espera é proporcional ao trabalho em andamento (WIP) dividido pela taxa de conclusão. Manter lotes pequenos aumenta a velocidade.




Eficiência do Processo

Razão de tempo agregando valor vs. tempo de espera (gargalos).



2.8 Incerteza e Complexidade: Estratégias de Navegação

Como gerenciar o comportamento imprevisível de redes e interdependências.

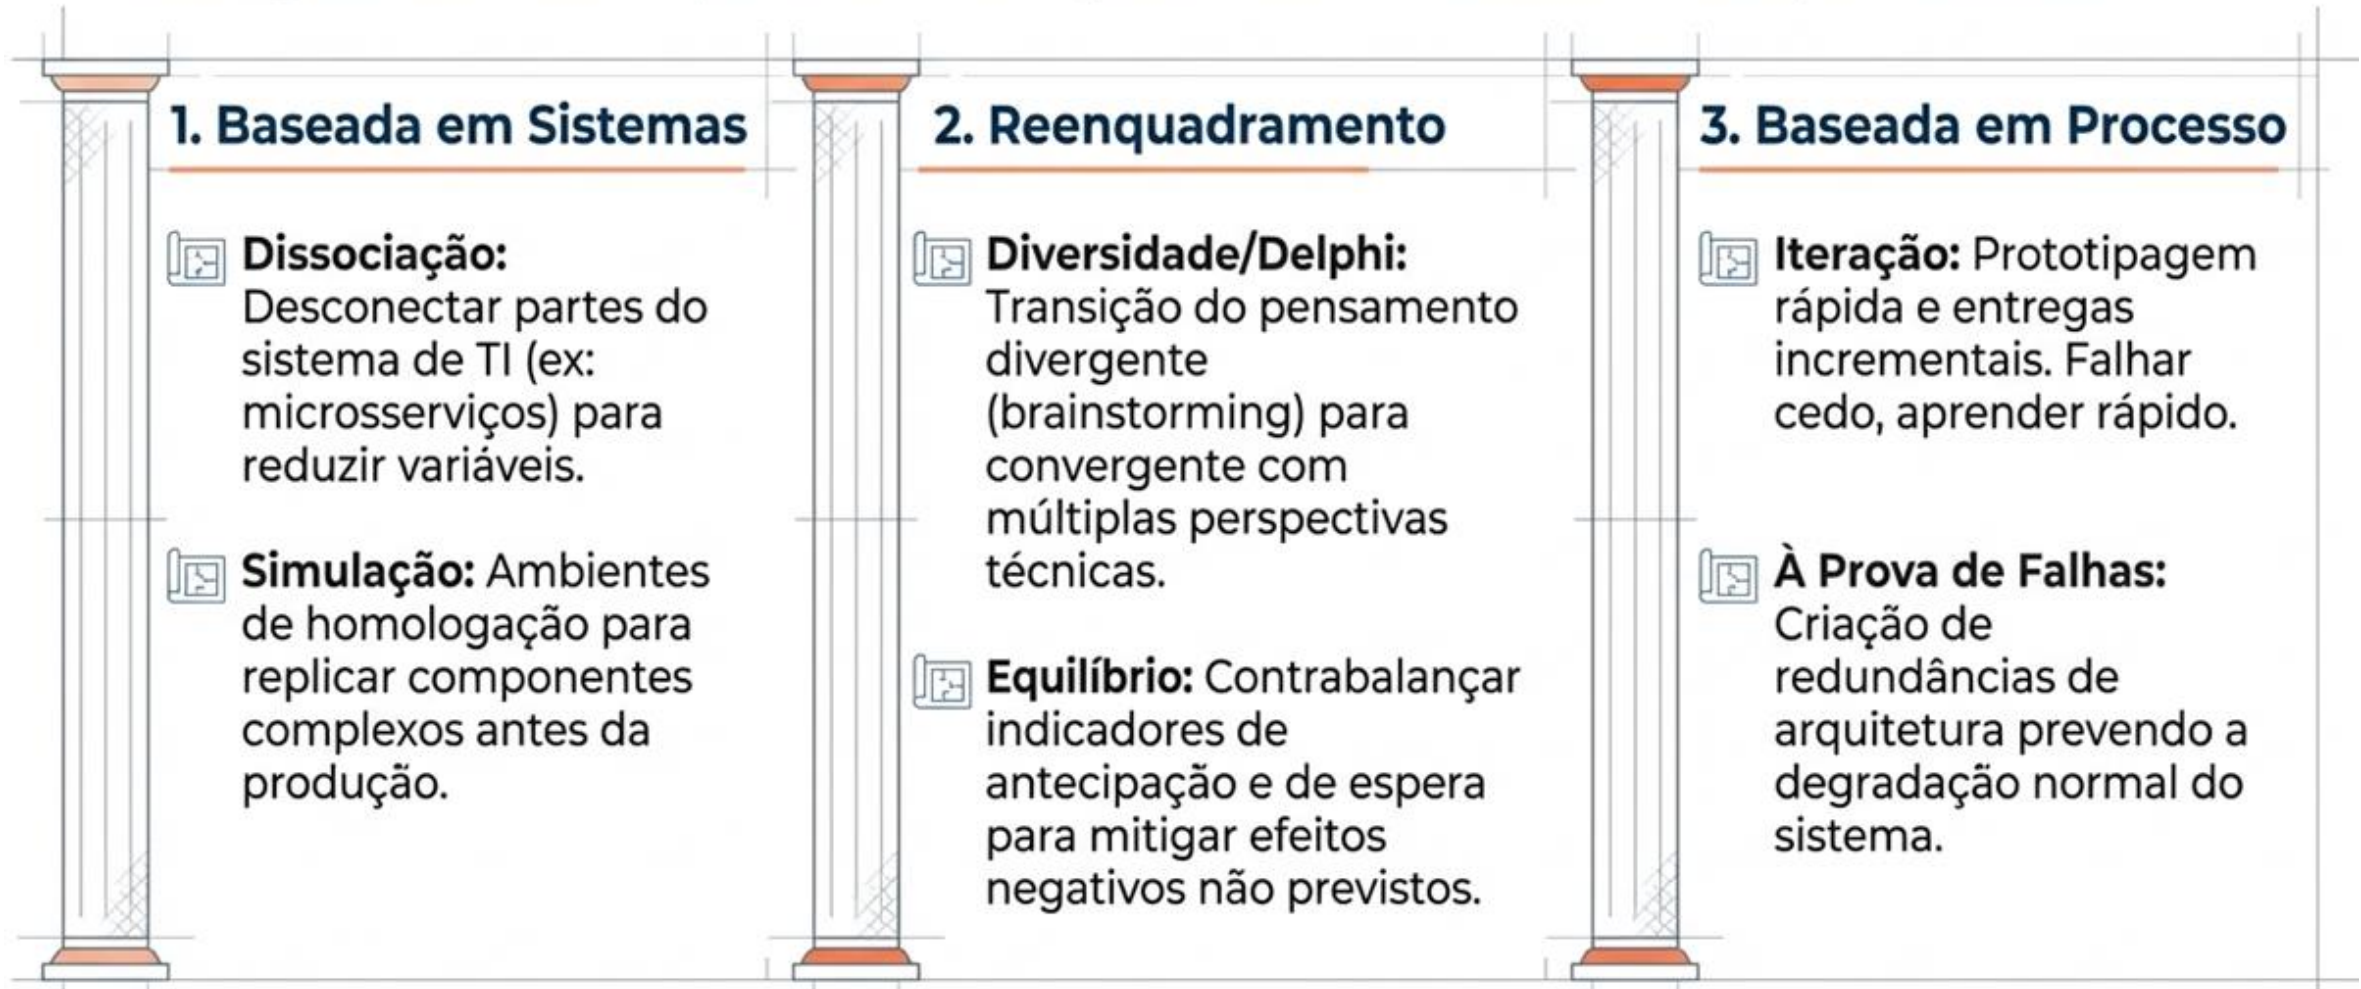

2.8 Incerteza: Proteção, Reservas e Verificação de Risco

Resultado Esperado	Forma de Verificação
Antecipação de ameaças/oportunidades em TI.	Sistemas ativos de captura de riscos adequadamente robustos.
Exploração proativa e resposta a riscos.	Respostas estão rigorosamente alinhadas às restrições do cronograma e orçamento.
Uso consciente das Reservas financeiras.	Reservas de cronograma e custo (burn rate) estão acompanhando as limitações estipuladas, prevenindo ameaças proativamente.

Exemplo Prático TI: Refatoração arquitetural programada.
O uso estratégico da reserva de contingência para liquidar débito técnico oculto antes que ele se transforme em uma falha de produção de alto custo (Quadrante 4 de CDQ).

Os 8 Domínios de Desempenho: Guia PMBOK® 7ª Edição

Foco em resultados e entrega de valor em projetos.

Foco em Pessoas e Colaboração



Partes Interessadas


Focado no engajamento, alinhamento de expectativas e na construção de relacionamentos produtivos com todos os afetados pelo projeto.



Equipe

Prioriza o desenvolvimento da liderança, o fomento à colaboração e a busca pelo alto desempenho do time.

Estratégia e Estruturação



Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida

Define a cadência das entregas, os métodos de trabalho (ágil, preditivo ou híbrido) e as fases do projeto.



Planejamento

Envolve a organização inicial e contínua, estimativas de recursos e a coordenação das atividades necessárias.



Execução e Entrega de Valor



Trabalho do Projeto

Foco na execução operacional, otimização de processos e gerenciamento físico e logístico das tarefas.



Entrega

Garante que o escopo e a qualidade atendam aos requisitos para gerar o valor esperado pelo negócio.

Monitoramento e Resiliência



Medição

Utilização de métricas e indicadores para avaliação de desempenho e controle de desvios.



Incerteza

Gestão proativa de riscos, prontidão para lidar com a ambiguidade e a complexidade do ambiente.

Referências Bibliográficas

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de projetos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.

SOUZA, Carla Patricia da Silva. **Gestão de projetos**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020.

VARGAS, Ricardo Vianna. **Gerenciamento de Projetos: Estabelecendo diferenciais competitivos**. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Contatos: roberto.paldes@ceub.edu.br (61) 98221 9083

