

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI


Encerramento de Projetos

Prof Roberto Paldês

ceub.br

[MATERIAL DE ESTUDO AUTÔNOMO: GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI]

sys.exit(0): A Arquitetura do Encerramento

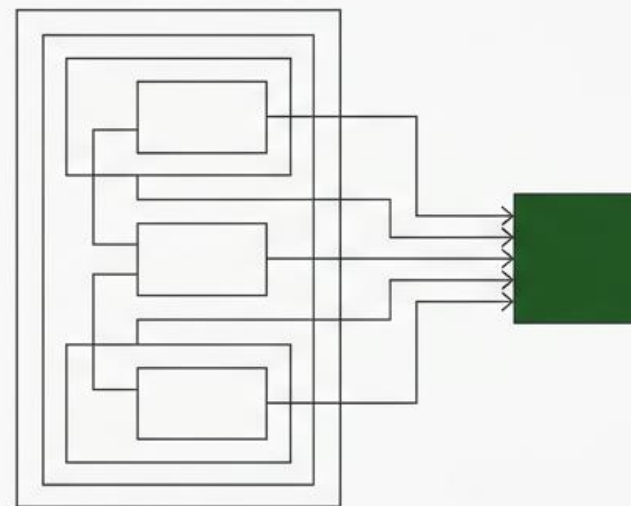

Desconstruindo o mito do deploy e a engenharia por trás do fim de projetos em TI.

Matriz de Ilusão vs. Realidade

A Ilusão Técnica


A Visão do Desenvolvedor



A crença perigosa de que o projeto termina quando a última linha de código é escrita ou o sistema entra em produção.


A Realidade Gerencial

A Visão da Gestão de Projetos

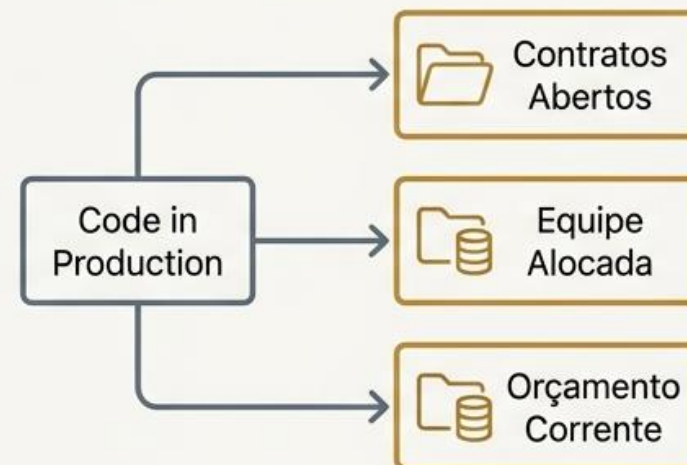

O deploy é apenas um marco técnico. O projeto permanece vivo, consumindo recursos institucionais, até que sua infraestrutura administrativa seja formalmente extinta.

A Física dos Projetos: O Fim é Obrigatório



‘Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.’ – Se é temporário, obriga a ter um fim claro.

Protocolo PMBOK 7ª Edição

- ☒ Conclusão formal confirmada
- ☒ Artefatos arquivados no sistema
- ☒ Equipe liberada de suas funções
- ☒ Contratos extintos

Nota: A percepção e manutenção de benefícios pós-entrega ocorrem estritamente antes do encerramento formal.

Alerta de Sistema: O Risco dos "Projetos Zumbis"

O projeto entregou seu valor principal, mas continua consumindo recursos institucionais como um processo fantasma.



Anomalia 1: O Disfarce

Pequenos ajustes, correções ou melhorias contínuas.



Anomalia 2: O Bloqueio

A transição formal para a equipe de Suporte/Operação nunca ocorre.

Diagnostic Radar

Software Entregue



Anomalia 3: O Dreno

Consumo contínuo de orçamento, horas da equipe e infraestrutura ociosa.

Premium Technical Documentation


Vazamento de Memória: O Custo de Não Encerrar



Sem o marco do encerramento, o criador fica acorrentado à ferramenta. A ausência de encerramento impede que talentos técnicos sejam realocados para novas inovações da empresa.

O Algoritmo de Desmobilização

O processo inverso da Gestão de Recursos. É o shutdown estruturado.

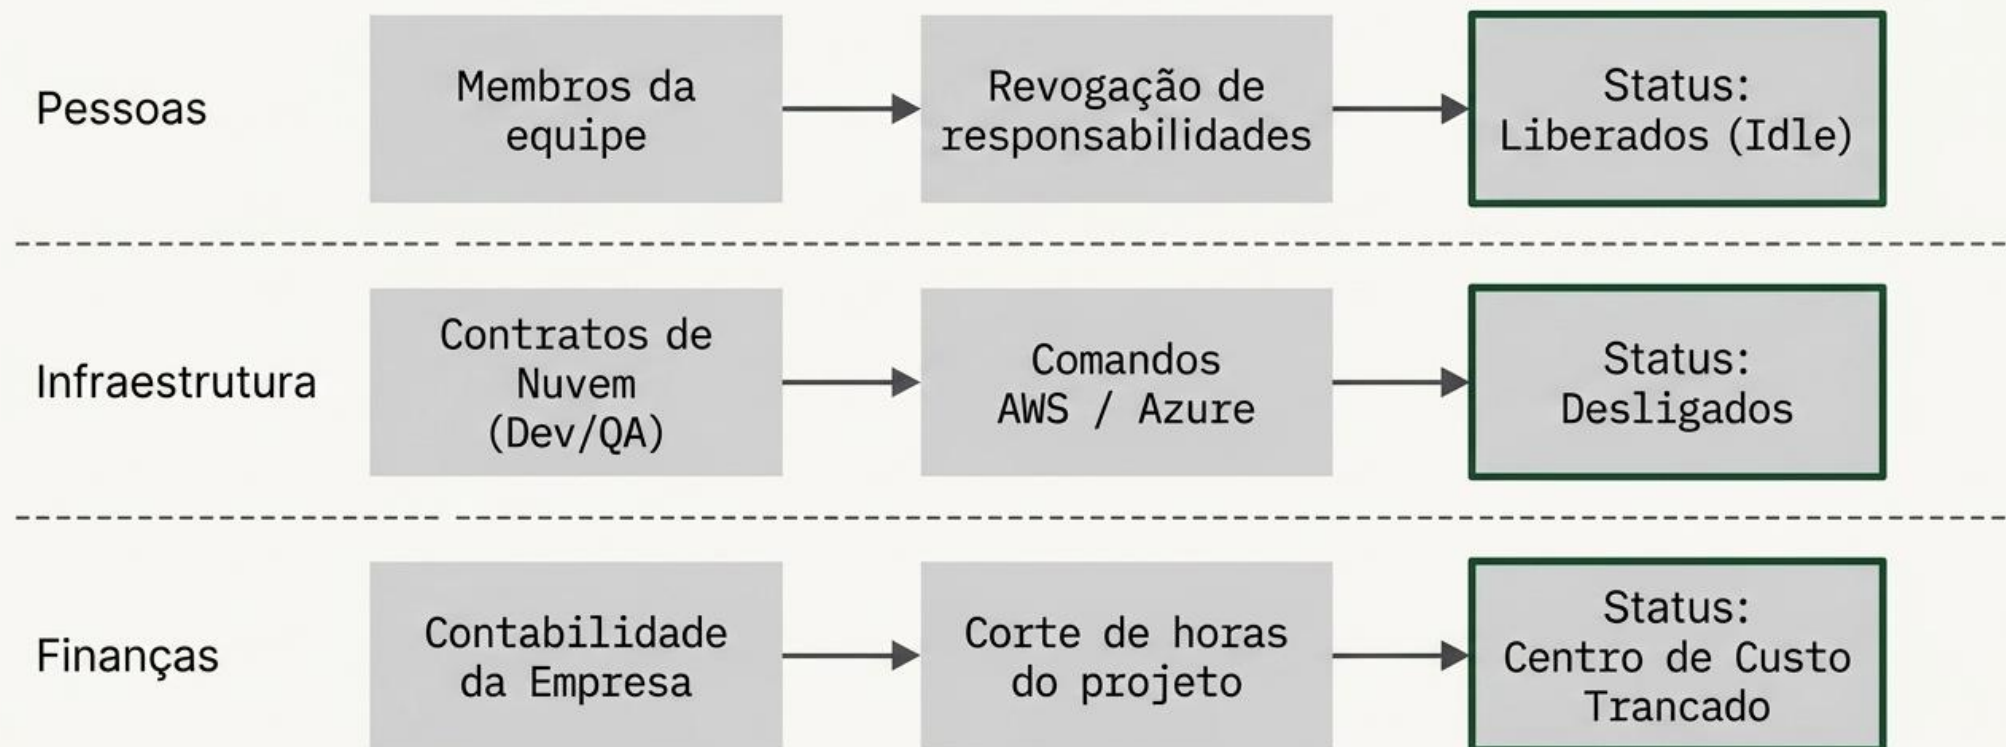


Transição de Estado do Sistema

	Estado: Em Execução (Runtime)	Estado: Encerrado (Terminated)
Pessoas	Alocadas e dedicadas às entregas do escopo.	Formalmente liberadas e disponíveis para o pool de talentos.
Infraestrutura de Nuvem	Ambientes de Dev/QA/Prod ativos e faturando integralmente.	Ambientes de Dev/QA desligados; apenas Produção transferida para Operações.
Orçamento / Contabilidade	Horas trabalhadas cobradas no Centro de Custo do projeto.	Centro de Custo extinto; cobranças interrompidas.

O Ouro Oculto: Extração de Logs (Post-Mortem)

O encerramento não é burocracia; é o momento de maior transferência de valor intelectual para a organização.

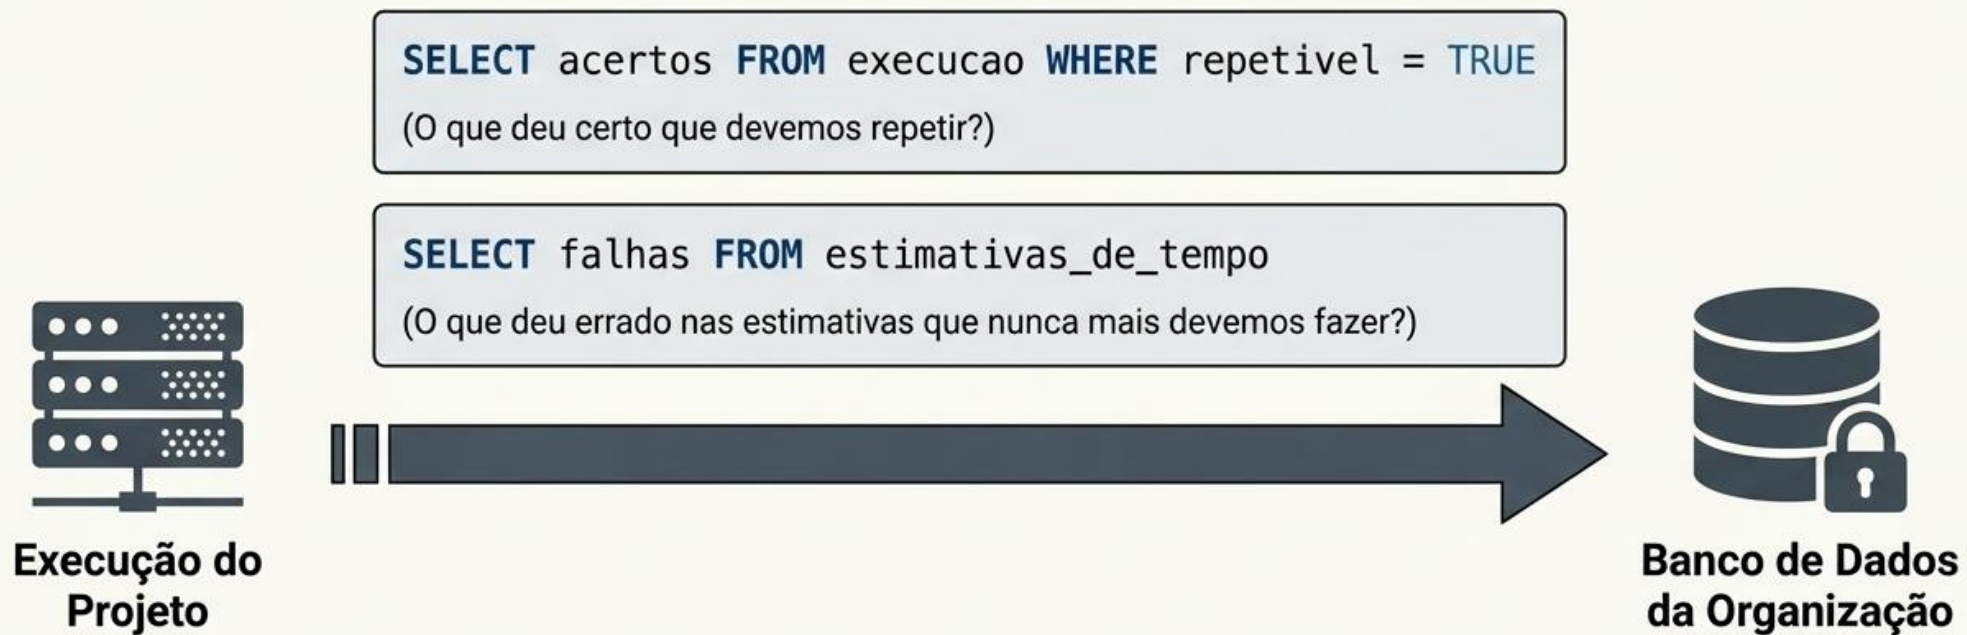

Atenção: Conhecimento restrito à cabeça do Gerente de Projetos é dado volátil. Ele exige documentação e arquivamento formal.

Escalabilidade de Conhecimento




O fim de um projeto financia a inteligência do próximo. Os artefatos arquivados tornam-se o código-fonte da maturidade da empresa.

O Falso Fim

Projetos são temporários para que a Inovação seja contínua.

- ✓ O deploy não é o fim da linha, é o início da Operação.
- ✓ O encerramento não é “apagar as luzes”, mas o upload de valor intelectual.
- ✓ Desligar servidores e fechar centros de custo é o ato definitivo de libertação dos criadores, garantindo que o talento retorne ao ecossistema para construir o amanhã.

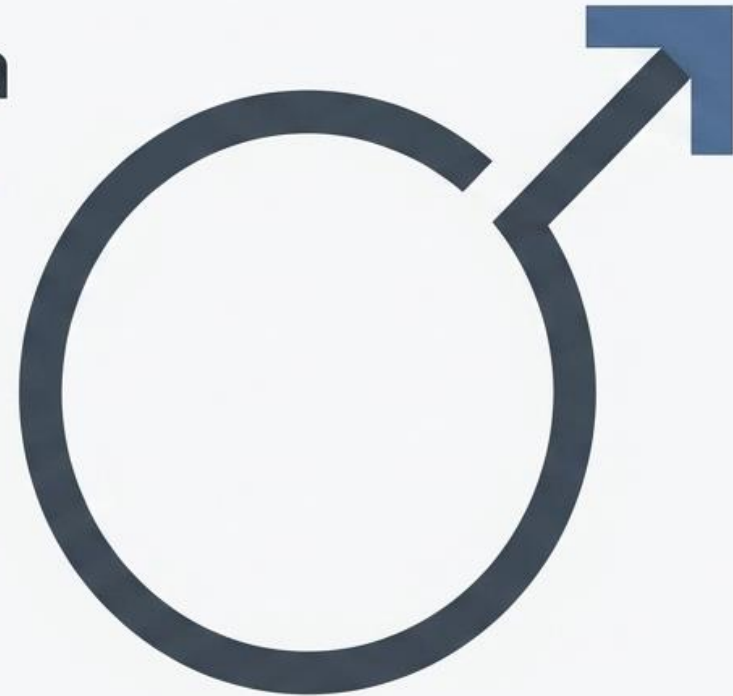

[SISTEMA_ENCERRADO] // Recursos_Liberados = True

O Fim da Linha na Gestão de Projetos de TI



Da entrega do código fonte à transição operacional.

[STATUS: SYSTEM_DEPLOYED_AND_CLOSED]

O Ciclo de Vida Documental de um Projeto

[INIT]

Termo de Abertura do Projeto (TAP)



Certidão de Nascimento

Autoriza o início do projeto e aloca os recursos iniciais.

[TERMINATE]


Termo de Encerramento do Projeto



Certidão de Óbito

Formaliza que todo o trabalho foi concluído e encerra o ciclo.

A Engenharia Reversa do Termo de Encerramento

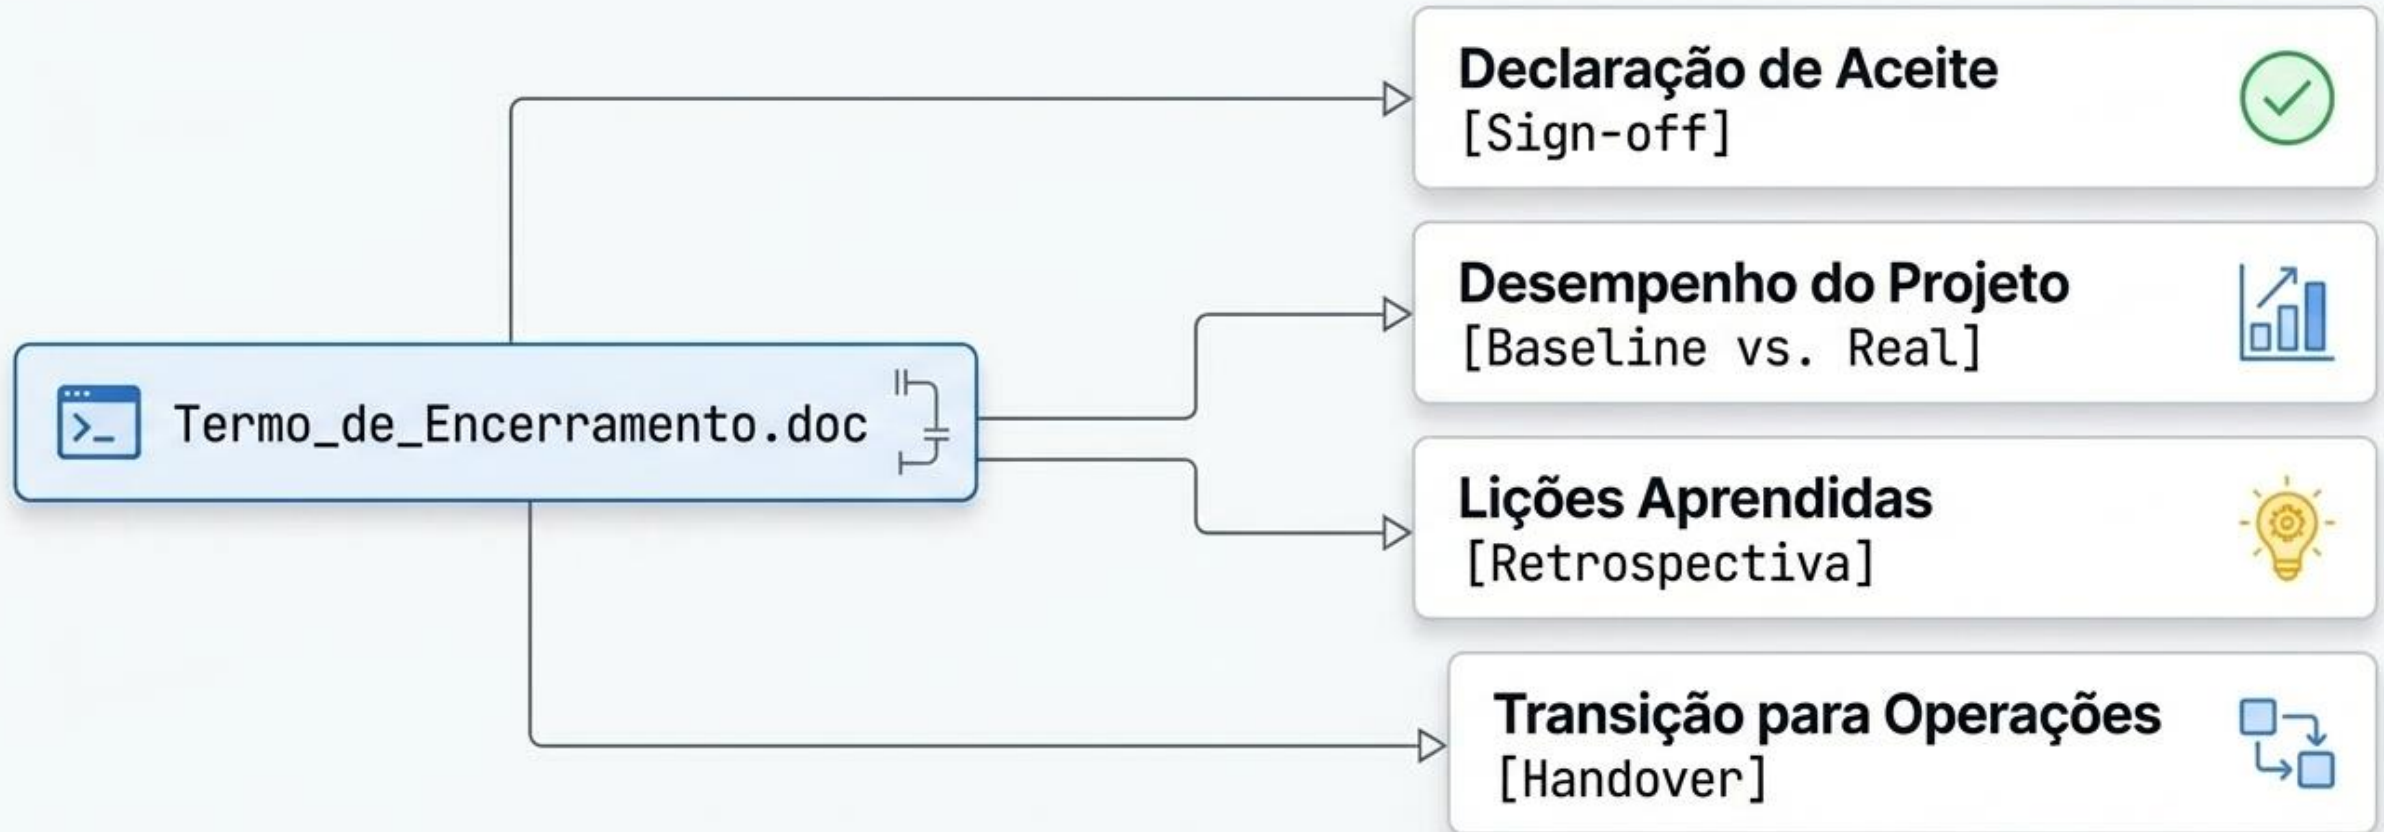

O encerramento não é apenas um documento final, mas um ecossistema de quatro pilares obrigatórios que garantem a segurança jurídica e operacional da equipe.

O Código Compilar Não Significa Aceite Formal

```
> IF Software entregue  
>   AND Software testado pelo cliente  
>   AND Cliente satisfeito com o resultado  
>
```

→ **THEN Assinatura do [Sponsor] ou Cliente**



[DIGITAL SIGNATURE]

Digital Signature

VERIFIED

A validação final transfere o risco e sela a entrega do escopo.

O Choque de Realidade do Desempenho Operacional

O documento exige uma comparação nua e crua entre a linha de base original e a realidade da execução.

Performance Dashboard

Orçamento (Budget)

Planejado: R\$ 5.000,00


Realizado:

R\$ 7.000,00

+40% OVERHEAD

Cronograma (Schedule)

[+1 MÊS DE ATRASO]

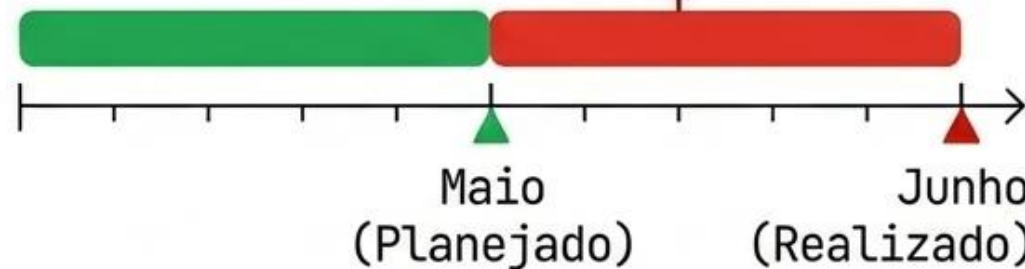

O Registro Honesto das Lições Aprendidas



Desafios Técnicos

- Arquitetura de software
- Bugs complexos
- Dívida técnica
- Gargalos de infraestrutura




Desafios Humanos

- Falhas de comunicação
- Conflitos de escopo
- Alinhamento de expectativas com o cliente

A retrospectiva deve ser um registro transparente para blindar e otimizar projetos futuros.

A Transferência de Custódia Logística

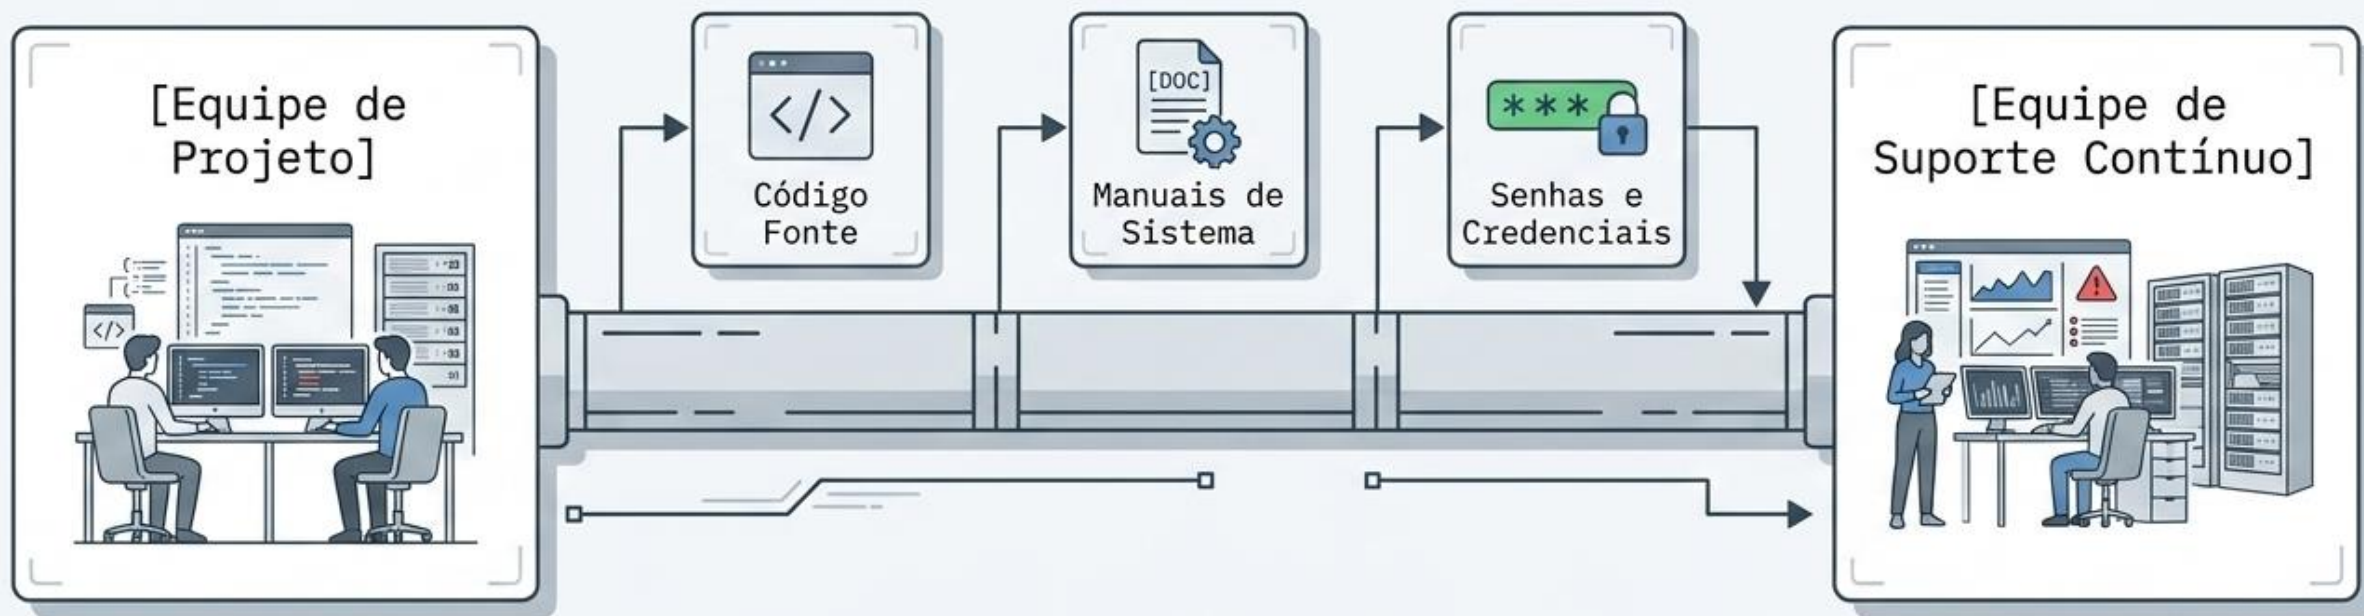

O Handover garante que o produto não morra quando a equipe de desenvolvimento original é desmobilizada.

A Prevenção do Projeto Zumbi

[X] Aceite Formalizado

[X] Desempenho Medido

[X] Lições Registradas

[X] Handover Concluído

Falhar em qualquer uma destas etapas resulta em um sistema sem dono ou em um projeto que drena recursos indefinidamente.

Bibliografias Base

Keeling, R. & Branco, R. H. F. (2019). Gestão de projetos. 4. ed. Saraiva Educação.

Keeling, R. & Branco, R. H. F. (2019). Gestão de projetos. 4. ed. Saraiva Educação.

Larson, E. W. & Gray, C. F. (2016). Gerenciamento de projetos: o processo gerencial. 6. ed. AMGH.

PMI. (2017 & 2021). Guia PMBOK®. 6ª e 7ª edições. Project Management Institute.

Material adicional

The image features a solid purple background. On the left side, there is a vertical rectangle filled with a white dotted pattern. Two thick lines overlap each other: a white line that starts horizontally from the left edge, then angles downwards to the right, and a dark purple line that starts horizontally from the left edge, then angles upwards to the right. The text "Material adicional" is positioned in the upper left area, within the dotted rectangle.

**Caso não tenha entendido algum ponto dessa apresentação,
leia o material explicativo em texto no seguinte endereço:**

https://drive.google.com/file/d/16g4WO2txsTcwrKXEN0qoi1-7p9ia_gKI/view?usp=sharing

Atividade



Link para a Fase 2

Teste seu conhecimento no seguinte link:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeOGofSxEmG1S8FsgqDLahj7j2mPKZxN7boyTPhM5YXrTPA/viewform?usp=publish-editor>

Referências

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a vertical rectangle with a dotted pattern. A thick white line enters from the left, curves around the bottom-left corner of the dotted rectangle, and then extends diagonally towards the bottom right. Another thick dark blue line enters from the top right, curves around the top-right corner of the dotted rectangle, and then extends diagonally towards the bottom left, crossing the white line.

Referências

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de projetos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

LARSON, Erik W.; GRAY, Clifford F. **Gerenciamento de projetos: o processo gerencial**. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** (Guia PMBOK®). 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos** (Guia PMBOK®). 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

roberto.paldes@ceub.edu.br (61) 98221 9083

